


大津信楽線付替工事ニュース

令和3年11月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新7号橋・新8号橋間道路改良その他工事
工 期：令和2年11月7日～令和4年2月1日

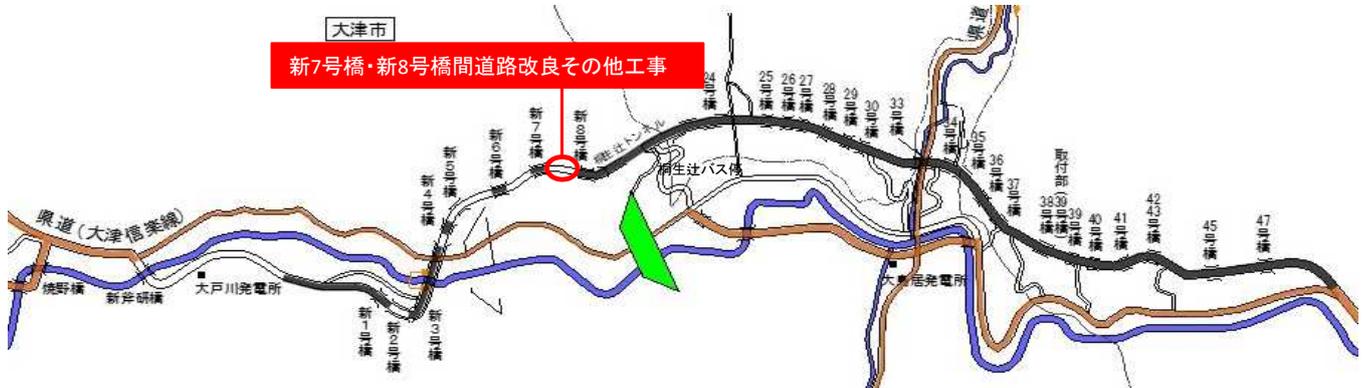

【現在の作業】11号補強土壁の基礎コンクリート部の掘削を行っています。

【今後の予定】16号切土補強土(法面補強工事)と11号補強土壁(擁壁)の基礎工事(モルタル吹付・足場の組立)を施工していきます。

工事現場の施工状況

監理技術者のコメント

施工状況
(9月末)

施工状況
(10月末)

11号補強土壁の掘削



大型クレーン(220tクレーン)を使用して左下写真のように20m伐採を行いました。伐採を行った分、擁壁の施工ができますので大幅な工期短縮が可能となりました。

現在は、擁壁基礎の掘削を行っておりますが、皆で意見を出し合い更に工期短縮できるよう努めています。引き続きご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。



監理技術者 米田 剛

OhYAMA (株) 大山建設

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-1700
077-549-1705

大津信楽線付替工事ニュース

令和3年11月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新5号橋・新7号橋間道路改良工事
工期：令和3年1月8日～令和4年2月28日

11月



現在の施工位置



排水構造物施工状況



転石破碎状況

現場代理人コメント

秋となり冬の訪れを近く感じて参りました。朝晩と日中の気温差に体調を崩すことの無いよう体調管理をしっかりと行って参ります。さて、今後の施工としまして、切土補強土工は掘削があと少しとなり鉄筋挿入工を行う予定です。10号補強土壁工は11月中旬に施工完了する予定です。引き続き、安全に十分注意して施工して参ります。

現場代理人
佐野 邦生



大津信楽線付替工事ニュース


令和3年11月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新3号橋・新8号橋間道路改良工事
工期：令和3年6月17日～令和4年3月20日

11月

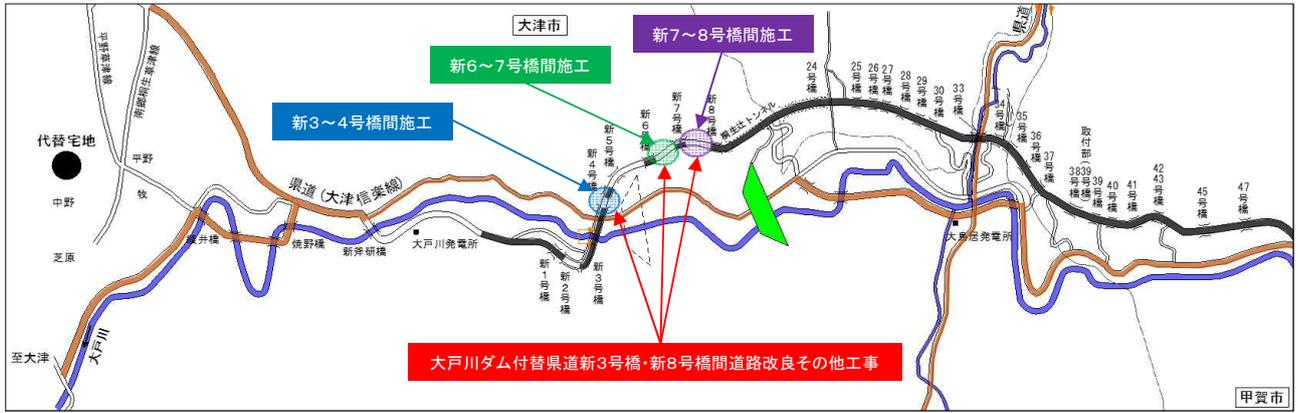

工事現場全景(新3号橋から新8号橋に向けて)



新3～4号橋間施工箇所



新6～7号橋間施工箇所



工事現場全景(新8号橋から新3号橋に向けて)



新7～8号橋間施工箇所(未着手)



現場代理人：寺内 敬嗣

新6～7号橋間では山の掘削と転石を撤去し、圧縮補強土工施工の床付けを行っています。
隣接工事との協力し安全第一で工事を進めます。また、工程の短縮を図り早期完成を目指します。
ご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。



株式会社 アクト

現場事務所
電話

大津市上田上桐生町地先
077-549-0010


大津信楽線付替工事ニュース

令和3年11月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線新2号橋上部工事
工期：令和3年4月1日～令和4年3月10日

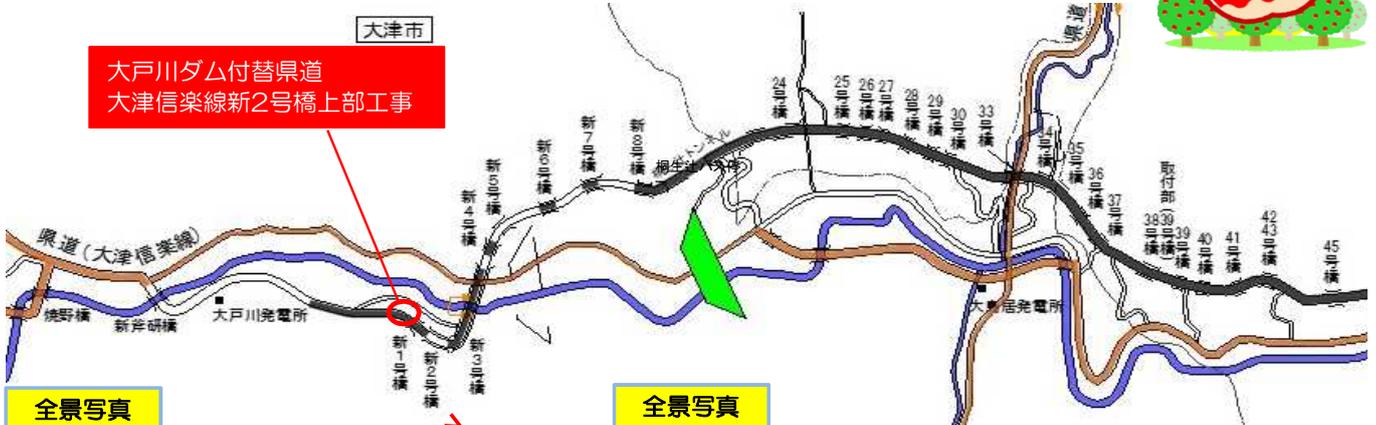

【現在の作業】 P1-P2径間架設作業終了後、最終径間(P2-A2)への架設桁移動作業を行っています。
【今後の予定】 11月中旬に、全径間の主桁架設作業が終了予定です。その後、架設桁解体作業を行っていきます。

工事現場の施工状況

施工状況（10月末）PC板敷設

PC桁架設後、桁間にPC板を敷設しております。
大型クレーンでの敷設が不可能となるため、小型クレーンを移動しながらの敷設作業を行っています。

施工状況（11月初旬）架設桁移動

次径間(P2-A2)施工のため、架設桁を前方へ移動させ、門型の吊装置の移動作業を行っています。



監理技術者のコメント

10月末に、2径間目のPC桁架設作業が終了しました。11月中旬には、全てのPC桁架設作業が完了予定としております。安全第一に、PC桁架設作業が完了できるよう、作業を進めていきます。
また、11月末には、架設桁の解体作業に入っていきます。
PC桁と同様に、まだまだ重量物を扱う作業が続いていきますので、危険な作業とならないよう、作業を進めていきます。今後ともご理解・ご協力の程宜しくお願い申し上げます。



監理技術者 稲葉 諒



大津信楽線付替工事ニュース


令和3年11月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線新5号橋上部工事
工期：令和3年3月31日～令和4年3月10日

11月

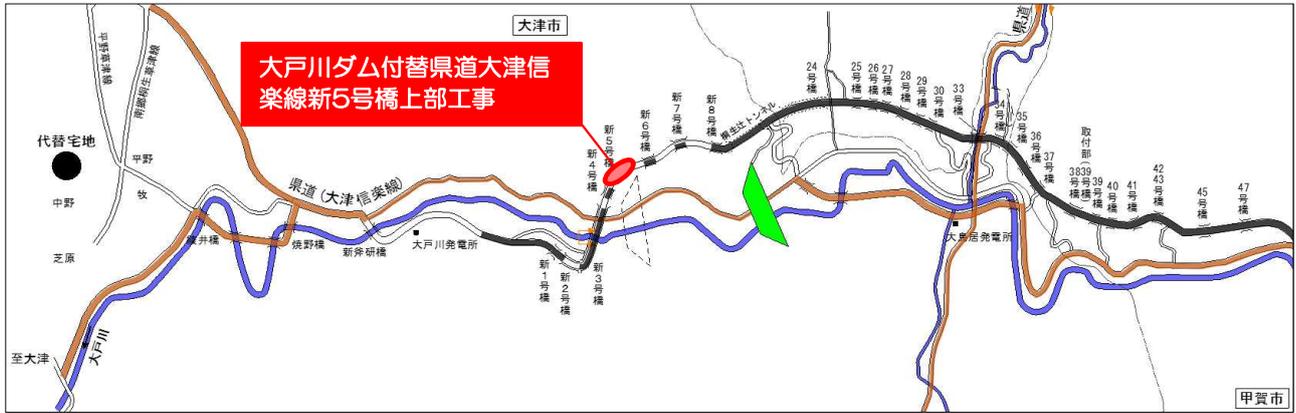

【現在の作業】 上部工の架設が完了しましたので、「吊足場」の組立てや「バント設備」の解体等を行っています。

現在の施工状況



主桁架設状況



G1桁横取り

現在、施工の方は主桁架設が完了しまして、吊足場の組立てやバント設備の解体を行っております。その後、11月中旬より巻立コンクリートの施工とバント杭の撤去を同時に施工して参ります。12月に入りますと合床版の施工を予定しております。高所作業がメインとなり、墜落災害には一層注意を払い、安全第一にて作業を行って参りますので今後ともご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。



現場代理人
貫 扇太郎



株式会社 名村造船所
NAMURA SHIPBUILDING CO.,LTD.

現場事務所 大津市上田上桐生町地先
TEL&FAX 050-5444-5662

大津信楽線付替工事ニュース


令和3年11月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道五本松交差点設置その他工事
工期：令和3年8月5日～令和4年3月10日

11月

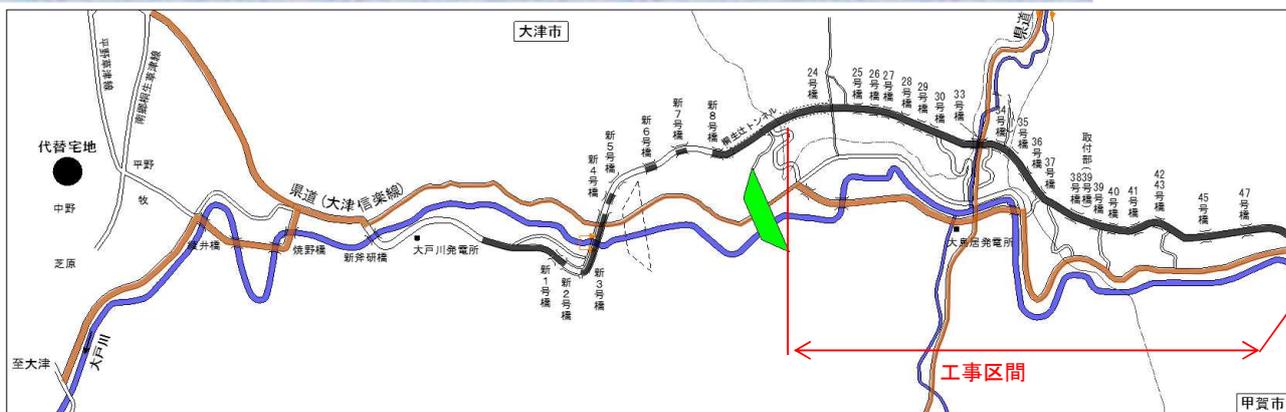

工事現場全景(45号橋から甲賀に向けて)



工事現場全景(甲賀から大津に向けて)

現場代理人：野々村 英樹

10月度は防草コンクリートの施工をしておりました。
11月度は防護柵工、舗装工を中心に施工してまいりたいと思います。
今後とも安全第一に施工を進めていきますのでご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。



株式会社 アクト

現場事務所
電話

大津市上田上桐生町地先
077-549-0010
