


大津信楽線付替工事ニュース

令和4年4月1日



バックナンバーは
QRコードを読み
込み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新7号橋・新8号橋間道路改良その他工事
工期：令和2年11月7日～令和4年5月20日

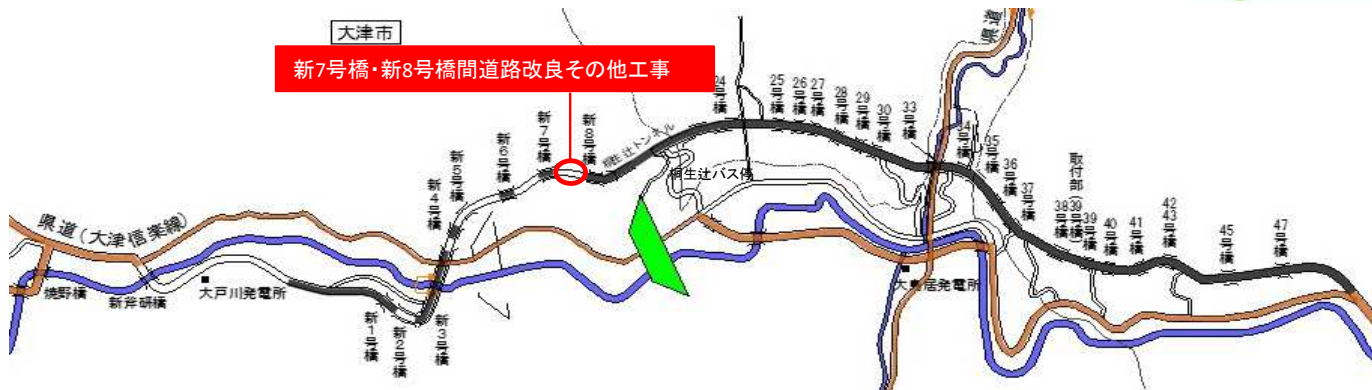


【現在の作業】11号補強土壁基礎部、基礎コンクリートの鉄筋挿入が完了し鉄筋組立を行っています。
【今後の予定】11号補強土壁基礎部の鉄筋組立 → 型枠組立 → コンクリート打設を繰り返し行っていきます。

工事現場の施工状況

監理技術者のコメント

施工状況
(2月末)

施工状況
(3月末)



現在、法面工事は4月初旬に植生基材（種子）吹付を行って完成します。
また、擁壁工事の鉄筋挿入144本の挿入が完了し、基礎コンクリート（左記図）の施工を行っています。今後も安全に十分留意し早期完成を目指し進めて参ります。今後もご理解とご協力を宜しくお願いいたします。



監理技術者 米田 剛

OhyAMA (株) 大山建設

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-1700
077-549-1705

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年4月



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道新3号橋・新8号橋間道路改良工事
工期：令和3年6月17日～令和4年6月15日

4月

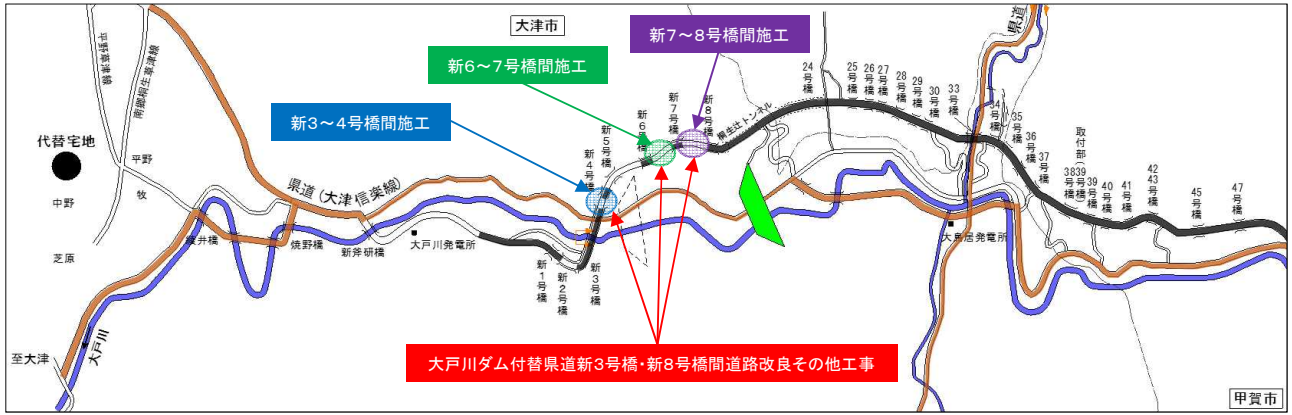

工事現場全景(新3号橋から新8号橋に向けて)



新6～7号橋間施工箇所



工事現場全景(新8号橋から新3号橋に向けて)



新7～8号橋間施工箇所



現場代理人：寺内 敬嗣

新6～7号橋間の10号補強土壁については軽量盛土工を12段目まで完了しました。3号橋～4号橋にかけては剛性防護柵基礎を施工開始しました。7号橋～8号橋については、軽量盛土の施工を開始しました。



株式会社 アクト

現場事務所
電話

大津市上田上桐生町地先
077-549-0010

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年4月



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道五本松交差点設置その他工事
工期：令和3年8月5日～令和4年6月15日

4月

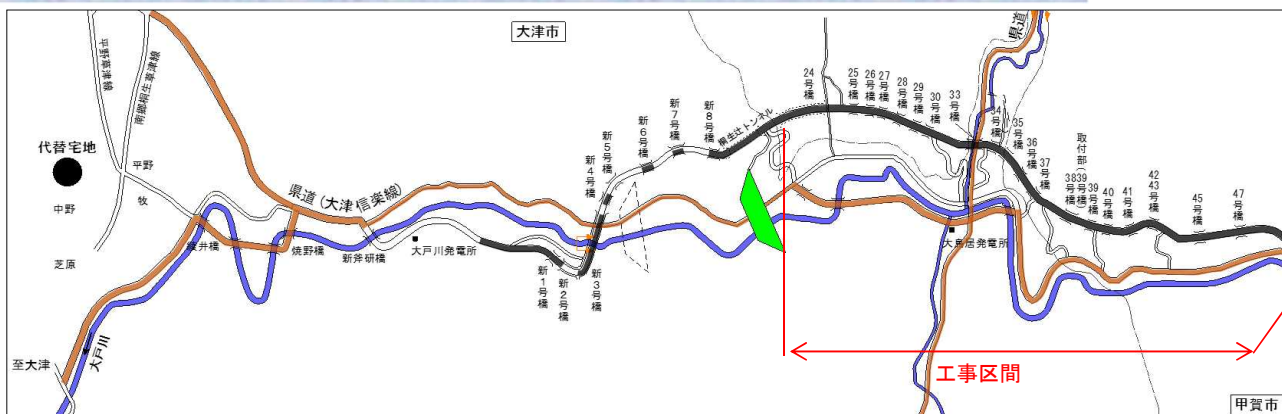

工事現場全景(大津から甲賀に向けて)



工事現場全景(甲賀から大津に向けて)



現場代理人：野々村 英樹

本工事もあと残すところ2ヶ月となりました。工事完工に向けて作業員一同安全第一で工事を進めて



株式会社 アクト

現場事務所
電話

大津市上田上桐生町地先
077-549-0010

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年4月



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線桐生辻トンネル他電気設備工事
工期：令和3年8月11日～令和4年5月28日

4月

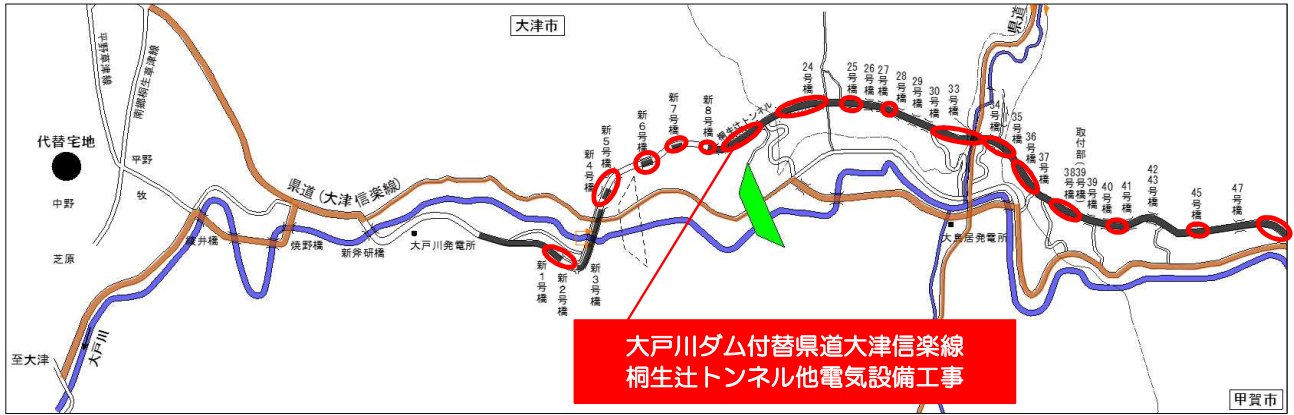

桐生辻トンネル

工事名	大戸川ダム付替県道大津信楽線桐生辻トンネル他電気設備工事
撮影箇所	桐生辻トンネル 終点側
撮影内容	3月度出来形
受注者	株式会社デューイテクニカル

: 取付箇所

桐生辻トンネル終点側(甲賀方面)から撮影

- トンネル照明盤設置完了
- 引込柱設置完了
- ソーラー式LED凍結注意表示板完了

【現在の作業】 引込柱設置作業等を行っています。

引込柱建柱状況

引込柱建柱状況

根柢ブロック取付状況

根柢ブロック取付状況

埋戻し後転圧状況

転圧状況


支線取付状況

支線取付状況

トンネル照明分電盤設置、引込柱設置、トンネル上流側の凍結注意表示板設置作業が完了しました。

今月は、道路照明設置工事、接地工事、橋梁配管工事を行っています。

今週から急に気温が上がり、熱中症に気を付けて安全第一にて作業を行って参ります。今後ご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。



現場代理人
下矢 智一

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年4月15日



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道桐生辻トンネル舗装他工事
工期：令和4年2月19日～令和4年9月30日

4月

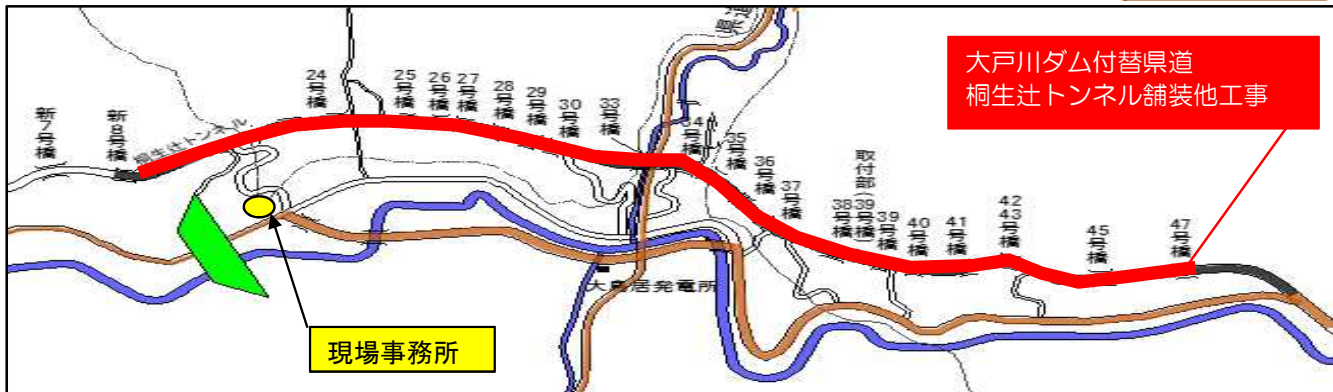

桐生辻トンネル
(大津側より)



24号橋 (大津側より)



【現在の作業】 現地照査と現場事務所の設置等を行っています。
【今後の予定】 現地測量及び防護柵工（嵩上げ）の工場製作を行う予定です。

24号橋
(着工前)



現場代理人コメント

この度、工事を受注させて頂きました
株式会社 昭建 です。
安全第一で進めてまいります。
宜しくお願いいたします。

現場代理人
香水 達弥



DYNAMIC SHOKEN
株式会社 昭建

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-552-4118
077-553-8414

大津信楽線付替工事ニュース


令和4年4月



バックナンバーは
QRコードを隠込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線下流区間他舗装その他工事
工期：令和4年2月22日～令和4年10月21日

4月

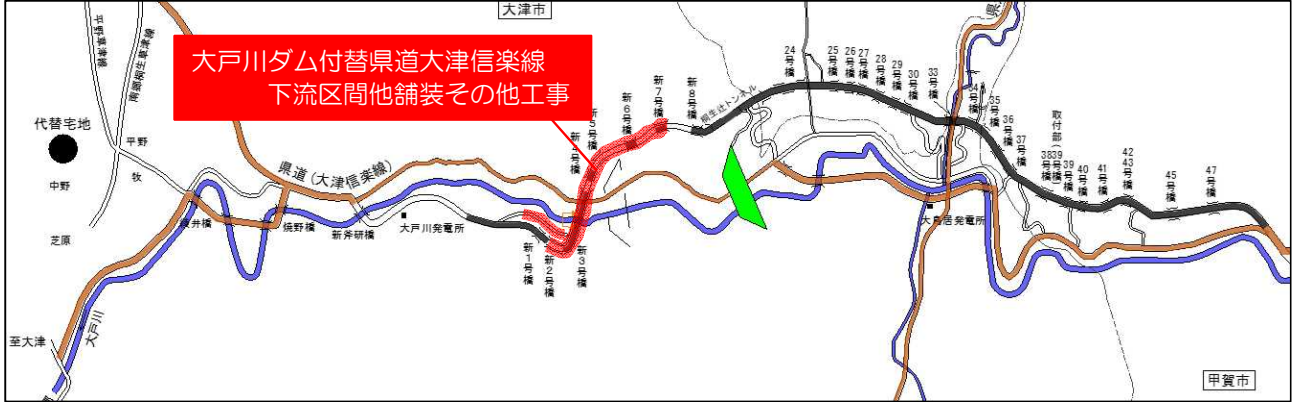

付替県道 上流から下流を望む
(新5号橋から新2号橋)



(市道(左岸線))



付替県道 下流から上流を望む
(新4号橋から新7号橋)

- 主な工事内容
ブロック積工、排水構造物工、橋梁付属物工、防護柵工、アスファルト舗装工、区画線工他
- 現在の作業
起工測量を行っています。
- 今後の作業予定
市道(左岸線)の仮設工(用水路の確保)を実施し、ブロック積工を進める予定です。

監理技術者コメント

この度、付替県道大津信楽線下流区間他舗装工事の施工をさせていただき事となりました。工事期間中は何かとご迷惑をおかけする事と思いますが、ご理解・ご協力の程宜しくお願いします。安全最優先、無事故・無災害完成を目指し、早期に完成できるよう努めてまいります。

監理技術者
岸 純一郎



未来につなぐ確かな道づくり
戸田道路株式会社

現場事務所 大津市上田上牧町斧研
電話 050-5371-1865
FAX 050-5371-1866
