

大津信楽線付替工事ニュース


令和5年1月



バックナンバーは
QRコードを読み込み
大戸川ダム
工事事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線桐生辻トンネル他電気設備工事
工期：令和3年8月11日～令和5年3月31日

1月

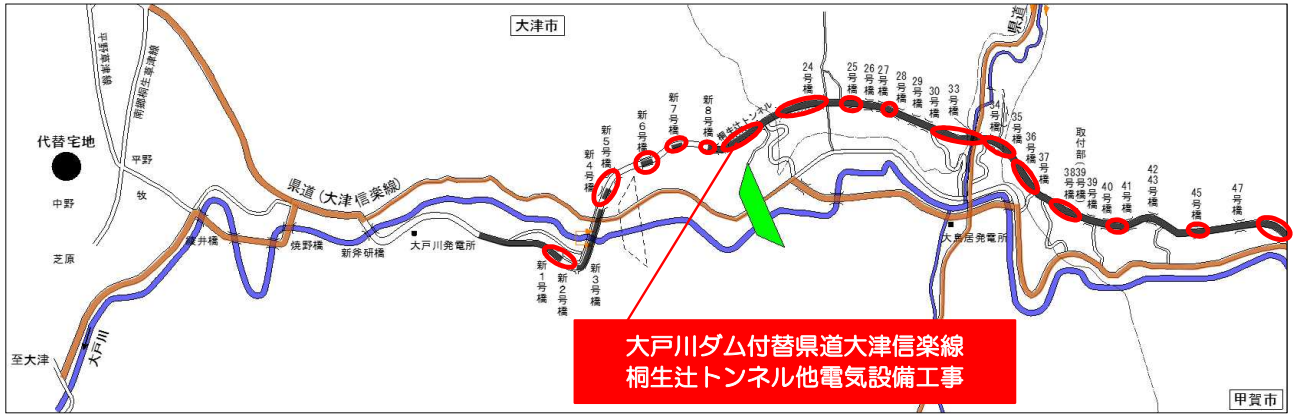

大津向きに撮影



甲賀向きに撮影

【現在の作業】 橋梁配管敷設作業を行っています。




- 今後の作業予定
- 道路照明：6号橋、7号橋建柱（終点側壁高欄）
- 凍結注意表示板：4か所（壁高欄・Gr共架）
- CCTVカメラ撤去：5か所

照明柱基礎設置、橋梁配管が完了しました。残りは橋梁の壁高欄に取付する照明柱、凍結注意表示板の設置、CCTVカメラ撤去工事のみとなりました。壁高欄に取付する架台製作が完了次第、設置予定です。

今後も体調管理、安全第一で引き続き作業を行ってまいります。今後ご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。

現場代理人
下矢 智一



Dewey 株式会社デューイテクニカル

現場事務所
電話

大津市上田上桐生町地先
077-549-0007

大津信楽線付替工事ニュース

令和5年1月



バックナンバーは
QRコードを読み込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道桐生辻トンネル舗装他工事
工 期：令和4年2月19日～令和5年3月31日

1月



新7号～新8号橋

法面植生基材吹付工を施工しています。



排水構造物・防護柵工を
施工しています。

トンネル上流側



法面モルタル吹付工を施工しています。

【現在の作業】

トンネル下流側（新7号～新8号橋間）の
法面植生基材吹付工・排水構造物工・防護柵工
トンネル上流側で法面モルタル吹付工
を施工しています。

【今後の予定】

引き続きトンネル上流部の法面工・防護
柵工及び新7号～新8号間の舗装工に
着手します。

監理技術者コメント

監理技術者
香水 達弥

新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。

法面作業・高所作業が多く危険と隣合せですが、
より一層気を引き締めて早期開通を目指し



 DYNAMIC SHOKEN
株式会社 昭建

現場事務所
電話
FAX

大津市上田上桐生町地先
077-549-1728
077-549-1728

大津信楽線付替工事ニュース


令和5年1月



バックナンバーは
QRコードを隠込
み大戸川ダム工事
事務所HPへ

工事名：大戸川ダム付替県道大津信楽線下流区間他舗装その他工事
工期：令和4年2月22日～令和5年3月31日

1月

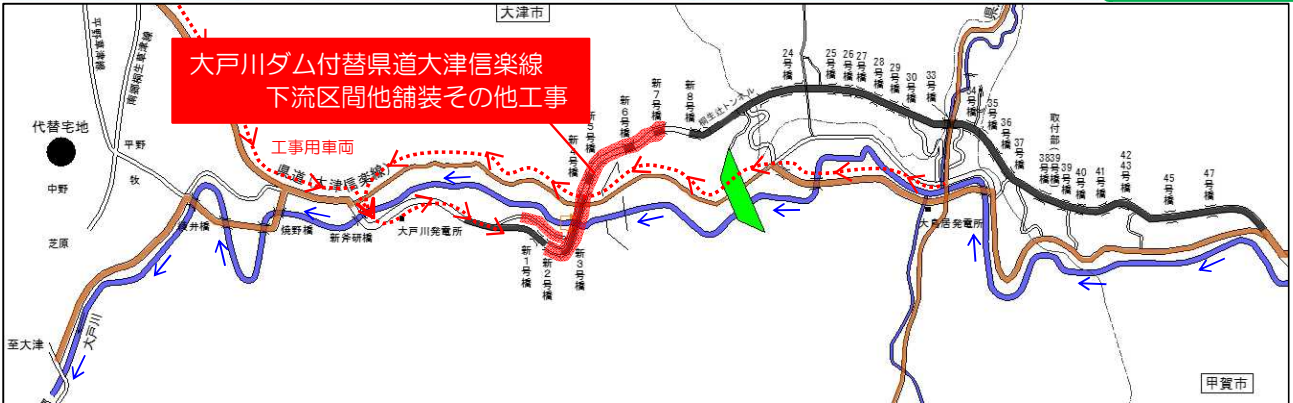

- 現在の作業
市道(左岸線)-----工事用取付道路の撤去
付替県道-----防護柵工(3号橋)
橋面防水工(6号橋、7号橋)
- 今後の作業予定
市道(左岸線)-----工事用取付道路の撤去・整形・捕植
付替県道-----舗装工(2号橋～7号橋)
防護柵工(5号橋～7号橋)
グルーピング工(2号橋～4号橋)
- 付替県道 現在の施工状況
現在3号橋において、落下防止柵の設置、7号橋で橋面防水を施工しています。2月末から残りの舗装工を着手していきます。



- 監理技術者のコメント
新年明けましておめでとうございます。
本年も安全、安心に努めてまいります。
どうぞ宜しくお願い致します。



監理技術者
岸 純一郎

未来につなぐ確かな道づくり
戸田道路株式会社

現場事務所 大津市上田上牧町斧研
電話 050-5371-1865
FAX 050-5371-1866
