


★轟4号橋の橋台部の施工が完了し、側径間部の施工に取りかかりました。



定点写真-①  
浅見1号橋(仮称)

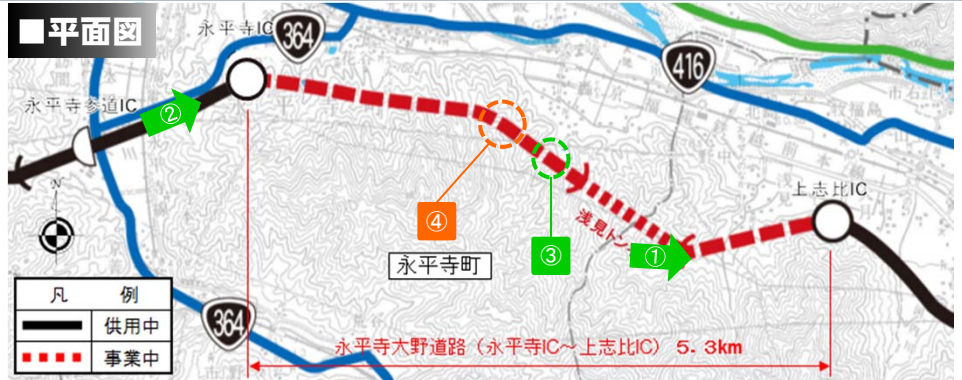

定点写真-②  
永平寺IC



P1橋脚(西側)



P2橋脚(東側)



定点写真-③:轟4号橋(仮称)

- ・轟4号橋(仮称)  
3径間連続ラーメン箱桁橋 橋長約216m
- ・上部工事の状況  
A1・A2橋台の施工が完了し、側径間部のブロックを施工するための支保工、型枠等を設置していきます。
- ・下部(橋台)工事の状況  
仮設工等の撤去作業に取りかかっています。

A2橋台(東側)



写真-④:轟西地区(土工区間)

- ・轟1号橋と轟2号橋の間の土工区間の状況  
土工区間(切土部)の工事を上の部分から順次、掘削しつつアンカー工を施工しています。

