


窪田遊水地工事ニュース

大和川窪田遊水地樋門築造工事【(株)本間組】



工事概要

- 洪水後の遊水地内に溜まった水を大和川に排水するための樋門を築造する工事です。
- 大地震発生時の樋門直下の地盤の液状化防止として地盤改良工を行っています。
- 来月からは改良した地盤の上に均しコンクリートを打設し、樋門本体に着手します。



お知らせ

引き続き、迂回道路を横断して工事車両の工事現場内への出入りが頻繁にありますので、通行の際は、徐行運転を行い対向車両や工事車両との接触防止、転落防止のためのご協力をお願いします。

年内の作業は、掘削作業が完了した箇所の現地盤の置換工を行い、先行打設した鋼矢板の残った分を打設し、完了になります。



床掘状況（11月20日時点）




置換状況（12月14日時点）



工事の流れ



大きな地震が発生した際に樋門直下地盤の液状化を防ぐため、固化材を添加した土砂で厚さ2mの地盤の置換を行っています。

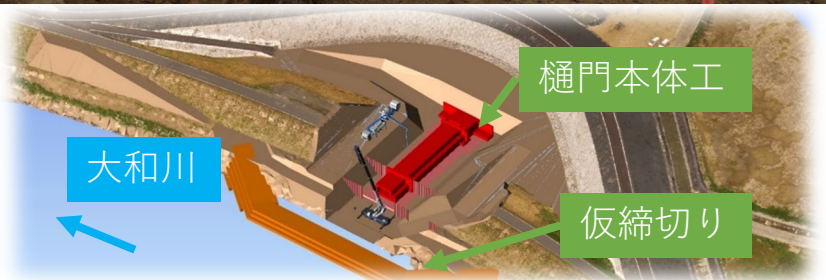

来年1月の施工イメージ図です。
樋門本体の型枠～コンクリート打設を行います。



工事の状況を
動画で公開！



12月20日時点


大和川窪田遊水地掘削築堤工事 【(株)城内組】



工事概要

○遊水地の貯水容量を確保するための掘削をしています。
その掘削土を改良し、**周囲堤整備**の一部整備（岡崎川沿川）、安堵町の**ゴミ中間処理施設の造成**を行っています。

12月20日現在、約56,000m³まで掘削が完了しています。

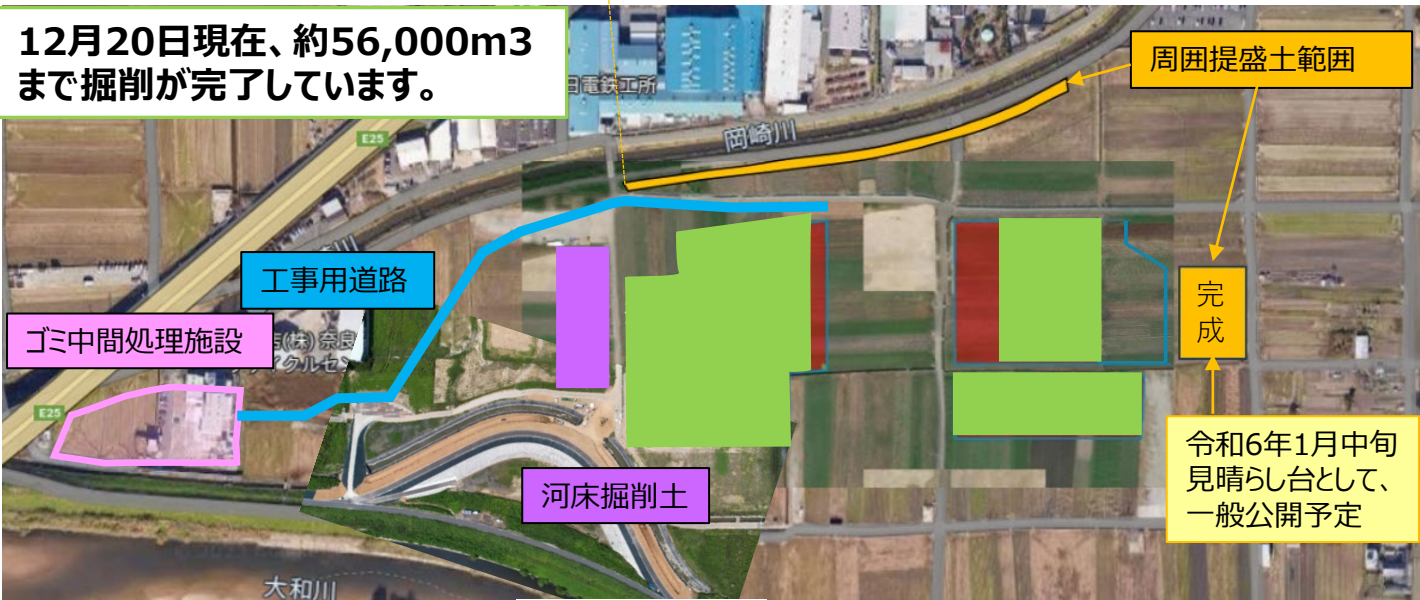

○**周囲堤整備**の状況
重力式擁壁工、排水構造物工を施工しています。



○**ゴミ中間処理施設の造成**の状況



○**見晴らし台**の完成状況



【問い合わせ先】

●事業計画に関すること 大和川河川事務所 工務課
〒582-0009 大阪府柏原市大正2丁目10番8号
TEL / 072-971-1381 (代)

(注意) 記載内容は、今後変更することがあります。

●工事・現場に関すること 大和川河川事務所 王寺出張所
〒636-0002 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-13-8
TEL / 0745-73-6571
