平成27年12月末　工事現場　永平寺大野道路（永平寺IC～上志比IC）

★轟4号橋のA2橋台躯体のコンクリート打設が完了しました。

■位置図

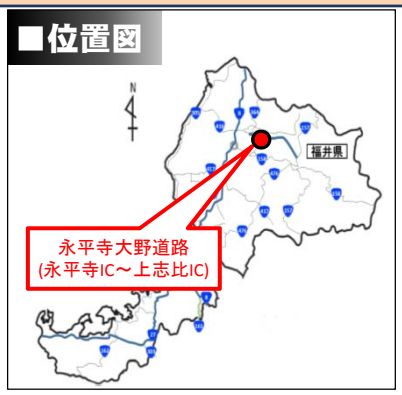

■平面図

定点写真-①
浅見1号橋(仮称)

定点写真-②
永平寺IC

P1橋脚（西側）

P2橋脚（東側）

定点写真－③:轟4号橋（仮称）

- **轟4号橋（仮称）**
  3径間連続ラーメン箱桁橋　橋長約216m
- **上部工事の状況**
  側径間ブロック部の施工に向けた準備を進めています。
- **下部（橋台）工事の状況**
  A2橋台躯体のコンクリート打設が完了し、側径間施工に着手しました。
  （A1橋台については施工中）

A2橋台（東側）

写真－④:上志比IC付近

- **上志比IC部付近の改良工事の状況**
  法面部の掘削を行って鉄筋挿入工を実施しています。
  現在、上から3段目の鉄筋挿入工を施工しています。

永平寺大野道路　（永平寺IC～上志比IC）　工事状況

（表示は本線部分の進捗を表したものです）
（模式図のため現場状況と一致しない場合があります）
