


資料 1 今後の進め方について (案)

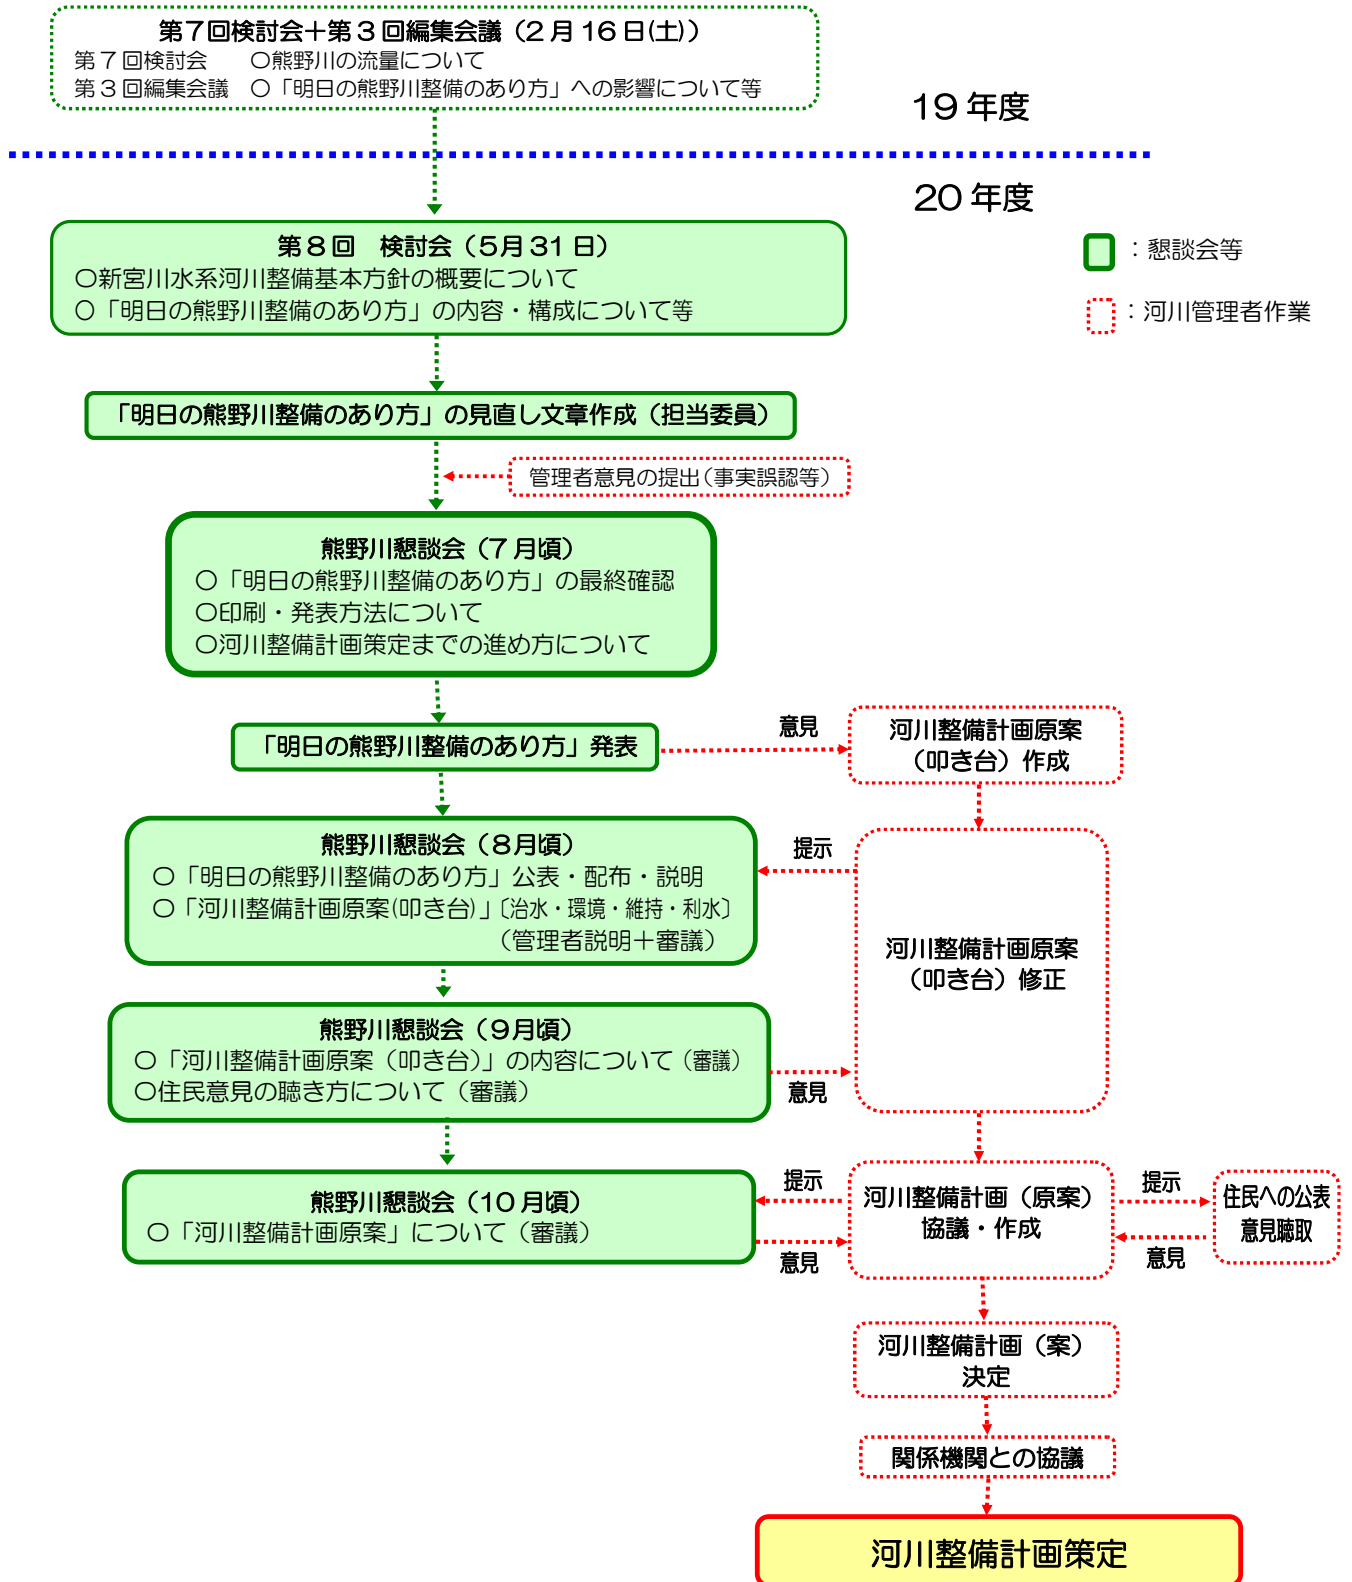

＜会議開催スケジュール（案）＞

	月	懇談会・検討会 (説明内容)	委員・庶務	河川管理者
19年度	12	第6回検討会		
	2	第7回検討会		
		第3回編集会議		
20年度	4			
	5	中旬 運営会議(17日)		
		下旬 第8回検討会	○基本方針概要確認、「明日の熊野川整備のあり方」内容・構成審議	
	6	上旬	○執筆委員による「明日の熊野川整備のあり方」文章修正	
		中旬		河川管理者による事実誤認等の確認
		下旬	○「明日の熊野川整備のあり方」(案)とりまとめ	
	7	上旬 運営会議		
		中旬 熊野川懇談会	○「明日の熊野川整備のあり方」(案)の最終確認、印刷・発表方法について ○河川整備計画策定までの進め方審議	
		下旬		
	8	上旬	○「明日の熊野川整備のあり方」印刷・発表	
		中旬 運営会議		「河川整備計画原案(叩き台)」作成
		下旬 熊野川懇談会	○「明日の熊野川整備のあり方」公表・説明 ○「河川整備計画原案(叩き台)」説明・審議	
	9	上旬		
		中旬 運営会議		
		下旬 熊野川懇談会	○「河川整備計画原案(叩き台)」、住民意見の聴き方について審議	
	10	上旬		「河川整備計画原案(叩き台)」審議を踏まえた「河川整備計画原案」作成
		中旬 運営会議		
		下旬 熊野川懇談会	○「河川整備計画原案」について審議	河川整備計画原案 公表(懇談会・住民) 原案に対する意見聴取(懇談会)
		29日 委員任期終 【必要な場合更新】		
	11	上旬		
		中旬		～原案に対する意見聴取(住民)
	12	上旬		
		中旬		～河川整備計画(案)協議・作成
	1	上旬		河川整備計画(案)決定
中旬			関係機関への整備計画(案)配布	
2	上旬			
	中旬		～関係機関との協議	
3	上旬			
	中旬		整備計画策定	
